

فهرست مطالب

۲	۱. مشخصات طرح	
۲	۱.۱. اهداف طرح	
۳	۱.۲. تاریخچه طرح	
۴	۱.۳. موقعیت جغرافیایی	
۵	۱.۴. مشخصات مدرسه	
۶	۲. تشریح وضعیت کلی طرح	
۶	۲.۱. جانمایی کارگاه	
۷	۲.۲. وضعیت اقدامات و رویدادها دوره گزارش	
	۲.۳. توصیف روند اجرایی پروژه	
	۳. ۱۵	
۱۶	۴. وضعیت مشکلات اجرایی	
۲۵	۵. ۲۵	
۲۶	۶. گزارش تصویری	

پروژه احداث هنرستان دخترانه هریس

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲

۱. مشخصات طرح

شماره پروژه: -----

تاریخ شروع پروژه: ۹۲/۳/۱

عنوان طرح: هنرستان دخترانه هریس

محل اجرا:

استان: آذربایجان شرقی شهرستان: هریس موقعیت: کیلومتر ۲ جاده هریس - گوراوان

نام دستگاه سرمایه گذار: موسسه خیریه همراه افق قریب

تاریخ شروع پروژه: ۹۲/۳/۱

مدت اجرای پروژه: ۲۰ ماه شمسی

کارفرما: سازمان نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

مشاور و دستگاه نظارت: دفتر فنی سازمان نوسازی مدارس

پیمانکار: موسسه خیریه همراه افق قریب

موضوع قرارداد: موضوع پیمان شامل اجرای کلیه کارهای مربوط به فونداسیون و سازه و سفت کاری و

نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی هنرستان دخترانه هریس

۱.۱. اهداف طرح

- ایجاد فضای آموزشی مناسب برای دختران هریس

- آموزش کاربردی و موثر متناسب با نیازهای منطقه

- ایجاد اشتغال فصلی برای نیروی کار منطقه

- کمک به ارتقاء فرهنگی منطقه

۱.۲. تاریخچه طرح

پروژه‌های احداث هنرستان دخترانه هریس

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲

بدنبال زلزله ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ در منطقه ارسباران (مناطق شهری و روستایی شهرستانهای اهر ، ورزقان و هریس) که منجر به ایراد خسارات اساسی به زیرساخت های اصلی شهری و روستایی آن مناطق نظیر بیمارستانها ، ادارات ، فضاهای آموزشی گردید و تعداد زیادی از ساختمانهای مسکونی اهالی آن مناطق تخریب گردید . در این حادثه متأسفانه تعدادی از هموطنانمان نیز جان خود را از دست دادند .



در نخستین روزهای پس از وقوع حادثه عوامل موسسه خیریه همراهه افق قریب بر اساس رسالتی که برای خود تعریف نموده است در منطقه حاضر و به بررسی و مطالعه عمق فاجعه و خسارات وارده پرداخت . با توجه به سطح و کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی در منطقه ، موسسه مصمم گردید در راستای ارتقای سطح آموزشی منطقه قدمی موثر و عملی بردارد لذا با هماهنگی مسئولان شهرستان هریس برای این منظور انتخاب و متناسب با نیاز منطقه تصمیم برآن گرفته شد که فضایی آموزشی بصورت هنرستان برای دختران شهرستان هریس ساخته شود پس از طی مراحل اولیه اداری و هماهنگی با سازمان نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی و تولید نقشه های سازه و معماری ، در ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ همزمان با روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره معلم شهید استاد مرتضی مطهری مراسم کلنگ زنی ساخت هنرستان با حضور مسئولان محلی همچون فرماندار محترم هریس ، مسئولان محترم اداره کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی استان و در حضور واقف و خیر محترم هریسی آقای حاج اسماعیل سعیدی انجام و عملیات اجرایی ساخت هنرستان آغاز گردید

پروژه‌ها حادثه‌ها شهرستان دخترانه هریس

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲

۱.۳. موقعیت جغرافیایی

محل اجرای پروژه در کیلومتر ۲ جاده هریس به روستای گوراوان واقع شده است .
کروکی محل اجرای پروژه به شرح زیر می باشد .

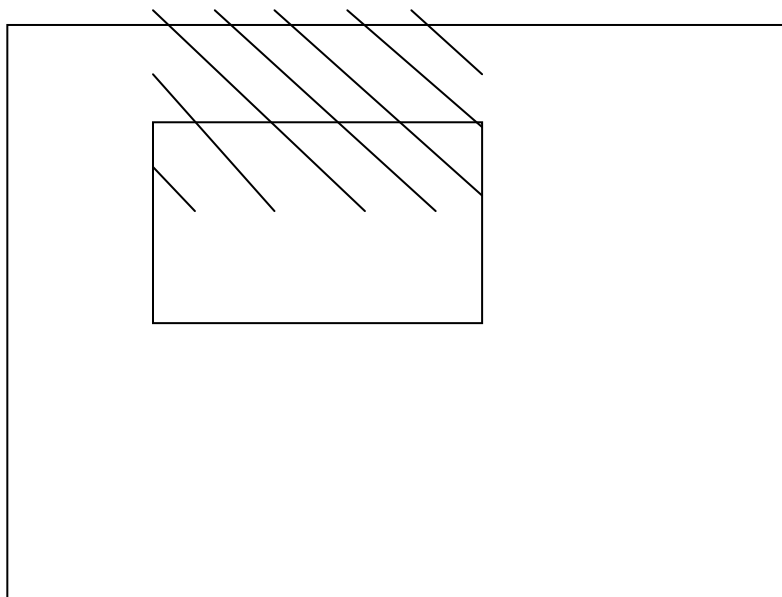

پروژه احداث هنرستان دخترانه هریس

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲

[Category]

۱.۴. مشخصات پروژه

مشخصات هنرستان دخترانه هریس

نوع سازه	اسکلت فلزی
ارتفاع پی نواری	۸۰ سانتی متر
ارتفاع از کف	۱۰ متر
مساحت	۱۸۰۰ متر مربع
طول	۴۳ متر
عرض	۲۳ متر
نوع پوشش سقف	بتنی با تیرچه پیش تنیده
تعداد کلاس	۹ کلاس
تعداد سالن چند منظوره	۵ کلاس

احجام عمده پروژه

کل خاکبرداری زیر فونداسیون	۹۰۰ مترمکعب	اسکلت سازه	۱۰۰ تن
بتن فونداسیون	۳۰۶ مترمکعب	میلگرد سقف همکف و	۸ تن
بتن سقف همکف و اول	۱۵۰ مترمکعب	آجرکاری	۳۰۰۰ مترمربع
میلگرد فونداسیون	۲۰ تن	گچ و خاک	۵۰۰۰ مترمربع

پروژه احداث هنرستان دخترانه هریس

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲

میزان آهک مصرفی زیر فونداسیون	۷۵ تن	سفید کاری	۵۰۰۰ متر مربع
میزان کاشیکاری	۶۰۰ متر مربع	آسفالت محوطه سازی	۴۰۰۰ متر مربع
نماسازی	۱۲۰۰ متر مربع	طول دیوار اطراف هنرستان	۶ کیلومتر

۲. تشریح وضعیت کلی طرح

۲.۱. جانمایی کارگاه

۲.۲. وضعیت اقدامات و رویدادهای اساسی دوره گزارش

بهمیز کارگاه

تجهیز کارگاه به منظور ایجاد امکان برای شروع و اجرای عملیات کاری با تامین تجهیزات زیر انجام شده است .

- تهیه و تامین ۲ دستگاه کانتینر جهت انبار وسایل و تجهیزات
- تهیه و تامین یک دستگاه کانکس ۲ اتاقه به منظور استقرار و اسکان نگهبان
- تهیه و تامین تجهیزات اولیه شامل بیل و کلنگ و فرغون
- تهیه کابل برق مورد نیاز
- تامین برق موقت ۲۵ آمپر

۲.۳. رویدادها و چالشهای اصلی پیش رو در دوره آتی

اتمام اسکلت فلزی و اتمام جوشکاری ستونها و تیرها
خرید تیرچه های پیش تنیده و بلوک های سقفی
مونتاز تیرچه ها و آرماتور بندی سقف طبقه همکف و اول
بتن ریزی طبقات

پروژه احداث هنرستان دخترانه هریس

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲

شروع آجرکاری
انجام تیغه بندی طبقات
شروع گچ و خاک
شروع کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی
شروع کاشیکاری
انجام نازک کاری
انجام پوشش سقف
محوطه سازی (جدول کاری و آسفالت محوطه)

جدول فعالیتهایی که طبق برنامه زمان بندی سومباید در ماه آتی آغاز گردد.

ردیف	شرح	تاریخ شروع مطابق برنامه	توضیحات
۱	خاکبرداری محل فونداسیون	۹۲/۳/۱	
۲	اجرای بتن مگر آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون	۹۲/۳/۳۱	
۳	بتن ریزی فونداسیون	۹۲/۵/۲۰	
۴	عملیات برش کاری و جوشکاری اسکلت فلزی	۹۲/۶/۱	
۵	بتن ریزی سقف طبقه همکف	-	
۶	بتن ریزی طبقه اول	-	
۷	اجرای آجرکاری طبقات	-	
	اجرای گچ و خاک	-	
	اجرای کارهای برقی	-	
	اجرای کارهای تاسیسات مکانیکی	-	
	اجرای نازک کاری	-	
	اجرای نما سازی	-	
۸	محوطه سازی	-	

۲.۴ توصیف روند اجرایی پروژه، تحلیل مسائل و ارائه نقطه نظرات

پروژه احداث هنرستان دخترانه هریس

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲

پروژه احداث هنرستان دخترانه هریس به عنوان یک ام خیر توسط موسسه خیریه همراه افق قریب با هدف رشد و ارتقاء سطح فرهنگی منطقه محروم هریس شروع و در حال اجرا می باشد .

اجراء:

- عمده فعالیتهای بخش تجهیزات کارگاه صورت پذیرفته است.
- اتمام عملیات خاکبرداری، اتمام بتن مگر و آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون .
- اتمام بتن ریزی فونداسیون .
- اجرای مونتاژ اسکلت فلزی .
- شروع نصب اسکلت شامل ستونها و تیرها و مهار بندها .
- عملیات نصب در حال جریان می باشد .

وضعیت مشکلات اجرایی

- کمبود نفرات اجرایی دارای تجربه کافی در بخش های مختلف در منطقه .
- کمبود مصالح در منطقه که امکان تامین سریع مصالح مورد نیاز را تحت تاثیر قرار می دهد .

	پروژه‌ها: هاست، سرور، دیتابیس	
	گزارش پیشرفت عملیات اجرایی آبان ماه ۹۲	

۴. تصاویر عملیات اجرایی پروژه تا آبان ماه ۹۲

.
